



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

.....
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙(๓) กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง ได้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และผู้บริหารท้องถิ่น ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อคณะกรรมการพัฒนา และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายถาวร วิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.077-270-534-5

ส่วนที่ 1 บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสงจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลพะแสง เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล โดยมีสำนักงานปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลพะแสงทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี และปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน กรรมการ

- | | |
|---|---------|
| (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน | กรรมการ |
| (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |
| (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน | กรรมการ |
| (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี และเปิดเผยโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล

(1) การติดตาม Monitoring เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานจะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามการดำเนินงาน กำหนดให้มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ จัดทำรายงานสรุปผล พร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง เป็นรายหกเดือน ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

(2) การประเมินผล Evaluation เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของการพัฒนาผ่านทางคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่และนำผลสรุปเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาให้เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไป

ส่วนที่ 3 การติดตาม

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง ประจำปี 2560


การวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	2560		2561		2562	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	40	51,354,000.00	20	21,780,000.00	17	18,440,000.00
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	14	2,415,000.00	9	2,020,000.00	8	1,020,000.00
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	160,000.00	2	60,000.00	2	60,000.00
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	6	170,000.00	7	1,460,000.00	5	160,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	4	2,500,000.00	3	800,000.00	5	850,000.00
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	0	0	1	100,000.00	2	1,900,000.00
รวม	67	56,599,000.00	42	26,220,000.00	39	22,430,000.00

การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	12	4,978,670.00
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	8	2,794,329.00
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	4	167,350.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	100,000.00
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-
รวม	25	8,040,349.00

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

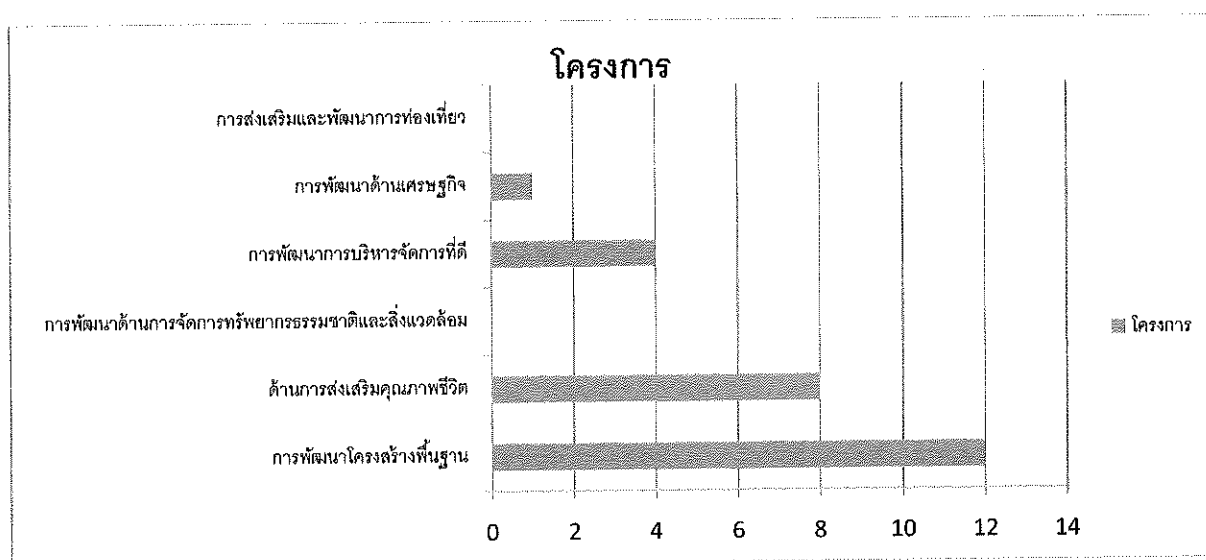

การใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	12	4,907,384.86	10	4,573,944.86
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	3	1,075,919.16	2	888,619.16
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	1	67,750.00	1	67,750.00
รวม	16	6,051,054.02	13	5,530,314.02

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญา	คู่สัญญา	วันที่เริ่ม สัญญา	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน
1.	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย ยานไธรมหมู่ 2	เงินสะสม	400,000.00	400,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยานไธรมหมู่ 2 ต.พะแสง/ สัญญาเลขที่ 19/2560	04/07/2560	45
2.	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง/ต่อ เติมสะพานหลังฝ่ายนบ ดาพิน	เงินอุดหนุนทั่วไป	148,000.00	147,750.00	วางแผนพื้นสะพานข้ามนบดาพิน/ สัญญาเลขที่ 27/2560	23/08/2560	60
3.	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	เปลี่ยนท่อประปา หมู่บ้าน (หมู่ที่ 7)	เงินสะสม	391,820.00	389,600.00	เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 7)/ สัญญาจ้างเลขที่ 22/2560	04/07/2560	45
4.	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กขยร่วมใจพัฒนา หมู่ 3	เงินสะสม	400,000.00	400,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กขยร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 ต.พะแสง/ สัญญาเลขที่ 20/2560	04/07/2560	45
5.	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย นาแสงถึง บางน้ำเย็น	เงินสะสม	400,000.00	400,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาแสงถึงบางน้ำเย็น ม.4 ต. พะแสง	04/07/2560	45
6.	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย ขอยช่อง เสียด หมู่ 5	เงินสะสม	498,000.00	498,000.00	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย ขอยช่องเสียด หมู่ 5/ สัญญาเลขที่ 15/2560	01/06/2560	45

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญา	คู่สัญญา	วันที่เซ็น สัญญา	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน
7.	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนน สายในทอน หมู่ 5	เงินอุดหนุนทั่วไป	185,690.00	185,690.00	โครงการบุกเบิกถนนสายในทอน หมู่ 5/สัญญาจ้างเลขที่ 26/2560	28/07/2560	45
8.	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย ความสามา หมู่ 8	เงินสะสม	400,000.00	400,000.00	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย ความสามาหมู่ 8/ สัญญาเลขที่ 18/2560	06/06/2560	45
9.	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 9	เงินอุดหนุนทั่วไป	314,700.00	314,000.00	ก่อสร้างถนนคสล.ข.ร่วมใจพัฒนา ม. 9/สัญญาเลขที่ 13/2560	23/05/2560	45
10.	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการถนนลูบ่อทั้ง ตำบล	เงินอุดหนุนทั่วไป	841,760.00	773,644.86	ถนนลูบ่อถนนทั้งตำบลพะแสง / สัญญาที่ 9/2560	16/03/2560	60
11.	ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียน	เงินอุดหนุนแบบ มีวัตถุประสงค์	1,140,000.00	574,740.00	-	01/11/2559	103
12.	ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุน อาหารเสริม	เงินอุดหนุนแบบ มีวัตถุประสงค์	630,429.00	313,879.16	ซื้ออาหารเสริม (นม) รร. 2 แห่ง สัญญาที่ 1/2560,ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 1 แห่ง บันทึกซื้อที่ 4/2560	31/10/2559	122
13.	ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินอุดหนุนทั่วไป	189,500.00	187,300.00	โครงการรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก/สัญญาจ้างเลขที่ 25/2560	20/07/2560	60

ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญา	คู่สัญญา	วันที่เริ่ม สัญญา	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน
14. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	เงินอุดหนุนทั่วไป	79,350.00	11,000.00	ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ LED จำนวน 2 เครื่อง /เลขที่สัญญา 21/2560	23/02/2560	5
				11,000.00	ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้/สัญญาเลขที่ 22/2560	13/03/2560	5
				6,800.00	ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน เลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้/สัญญา เลขที่ 23/2560	13/03/2560	5
				20,000.00	ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าขาว ฟอร์เมกา จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 2000 บาท/สัญญาที่ 24/2560	13/03/2560	5
				8,500.00	ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๙ จำนวน ๑ ชุด/ สัญญาที่ 19/2560	03/02/2560	8
				6,000.00	ซื้อส่วนแทน จำนวน 1 ตัว/สัญญา ที่ 25/2560	13/03/2560	5
				2,200.00	ซื้อมอเตอร์หี้นไฟ 6 นิ้ว มอเตอร์ 1/3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว/สัญญาที่ 9/2560	16/11/2559	5
				2,250.00	ซื้อเคเบิลจิกซอร์ กำลังไฟฟ้า 450 วัตต์ จำนวน 1 ตัว/สัญญาที่	16/11/2559	5

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญา	คู่สัญญา	วันที่เริ่ม สัญญา	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน
						9/2560		
15.	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบางครก	เงินสะสม	499,700.00	499,700.00	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบางครก หมู่ 6/สัญญา เลขที่ 16/2560	01/06/2560	45
16.	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหัว หมู่ 1	เงินสะสม	499,000.00	499,000.00	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหนองหัว หมู่ 1/สัญญา เลขที่ 17/2560	01/06/2560	45

แบบแสดงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
1	นายพิชัย พินลานุ่ม	ประธานกรรมการ	สามารถดำเนินการโครงการได้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานและบริบทของพื้นที่ การพิจารณาคัดเลือกโครงการให้เน้นปัจจัยด้านพื้นที่เป็นสำคัญจึงจะสามารถ ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
2	นางสาวนฤมล ศรีคำ	กรรมการ/เลขานุการ	-ไม่มี-
3	นายอนันต์ สุขจันทร์	กรรมการ	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสงได้พิจารณาดำเนินการและควบคุม โครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของ โครงการ
4	นายฉลาด ชื่นพระแสง	กรรมการ	-ไม่มี-
5	นายวิฑิต ทองจันทร์	กรรมการ	โครงการตามแผนพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีความ เหมาะสมในการคัดเลือกโครงการมาดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ต.พะแสง
